

Web マーケティング環境整備支援事業企画運営業務
企画提案書

特定非営利活動法人 IT コーディネータ広島

目次

1	実施方針	・・・ 1
	独自提案事項(整理)	・・・ 2
2	事業周知・参加者(支援企業)確保	・・・ 3
	(1) 具体的な周知・確保の施策	・・・ 3
	(2) 事業周知ターゲット企業および目標の算出根拠	・・・ 4
3	伴走支援	・・・ 5
	(1) 伴走支援のプロセス	・・・ 5
	(2) 伴走支援企業数の目標および算出根拠(目論見)	・・・ 11
4	導入支援(助成金交付事務)	・・・ 12
	(1) 助成金の制度設計(提案)	・・・ 12
	(2) 助成金交付事務局の運営	・・・ 14
5	スケジュール	・・・ 16
6	実施体制	・・・ 16
7	類似業務実績等	・・・ 17
8	本業務実施に当たっての優位性	・・・ 18

1 実施方針

本事業は、物価高騰等の影響下にある県内企業が、商談会等に出展した場合もスポット的な取引にとどまることがや発注企業主導による価格優先のマッチングに陥りがちといった課題の解決を目指し、デジタルマーケティングの手法を活用して、継続的な販路の拡大に取り組むための環境整備を目的とする。仕様書に示された「個別あっせん」や「広域商談会」における課題は、主に製造業での状況と考えられることから、製造業を主要な支援対象と想定しつつも、提供する支援の枠組みは業種に限定せず幅広く適用する。

この目的を達成するため、当社構成員である専門家の知見を活用し、以下の3点を軸に業務に取り組む。

○ 実行可能性を重視した計画の最適化

Webマーケティングは、時間的・物理的な制約を受けず情報発信し、継続的に顧客接点を維持できる利点を持つ。この利点を活用し、「営業体制も十分に備えることが難しい状況」にある県内企業の現実を補完するため、各社が確実に取り組むことができる最適な計画を追求する。実際の業務現場で運用できる手法を検討し、自社商材や伴走支援の段階で提示するWebサイトモックアップといった現物を確認しながら検討を進めることで、実践に注力する。

○ 手段と目的の明確化

継続的な安定した取引の確保につなげるため、Webサイトの制作や改修を最終目的とせず、本質的な課題解決に向けた基盤として活用する。Webマーケティングの特性である「自社の強みの直接的な発信」と「データに基づく客観的な検証」を支援の軸とする。具体的には、アレンジ版ビジネスモデルキャンバス等を用いてキーコンテンツやターゲット顧客の利得を客観的に整理し、支援企業自身が強みを的確に発信できる論理的な基盤の構築を最優先とする。


○ スポットの支援からの脱却と、自立化・自走化に向けた取り組み

支援企業におけるデジタルコンテンツの導入をゴールとせず、導入後も客観的なデータに基づいて継続性をもって運用されることを重視する。本業務期間内において、専門家による伴走支援や連携体制に基づく継続的な支援を実施する。

以上を通じて、本事業終了後も県内企業と地域の専門家やITベンダー等が協力し、継続的に取組が展開される好循環の創出に取り組む。

業務の全体像

※県内商工会・商工会議所、県中央会（機械工業組合）、金融機関等

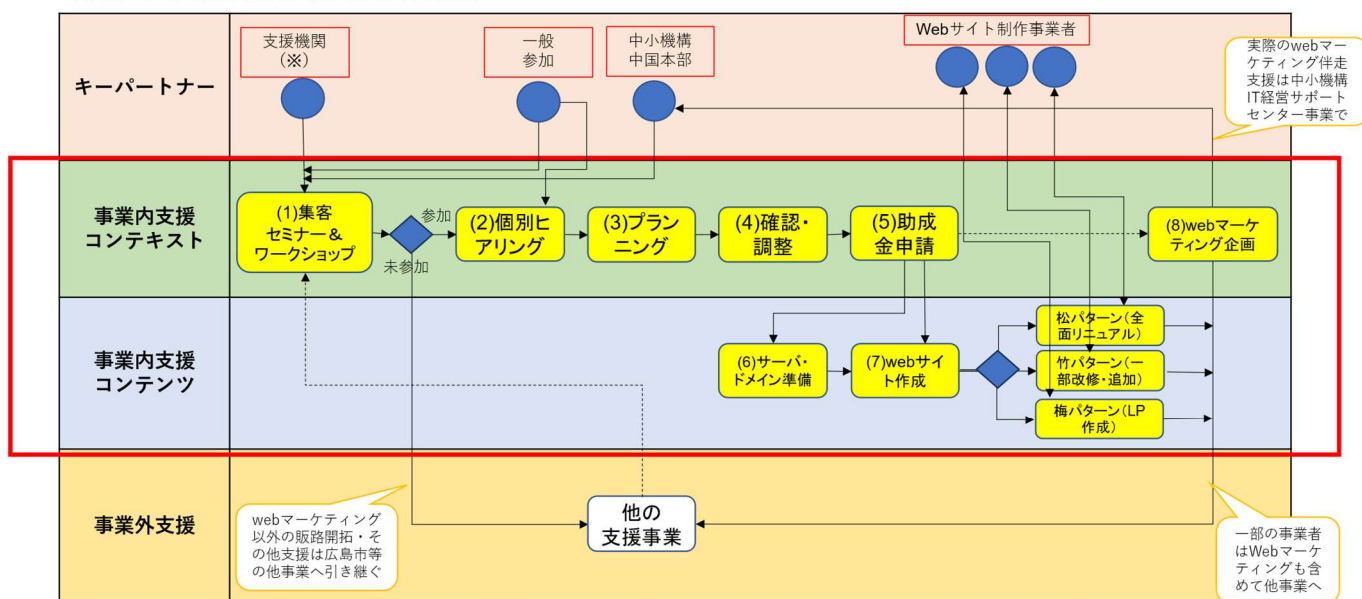


◆企画提案において設定すべき目標等

○目標

事業周知ターゲット企業数:3,800 社

コンテンツ導入支援企業数＝伴走支援企業数:100 社

パイプライン

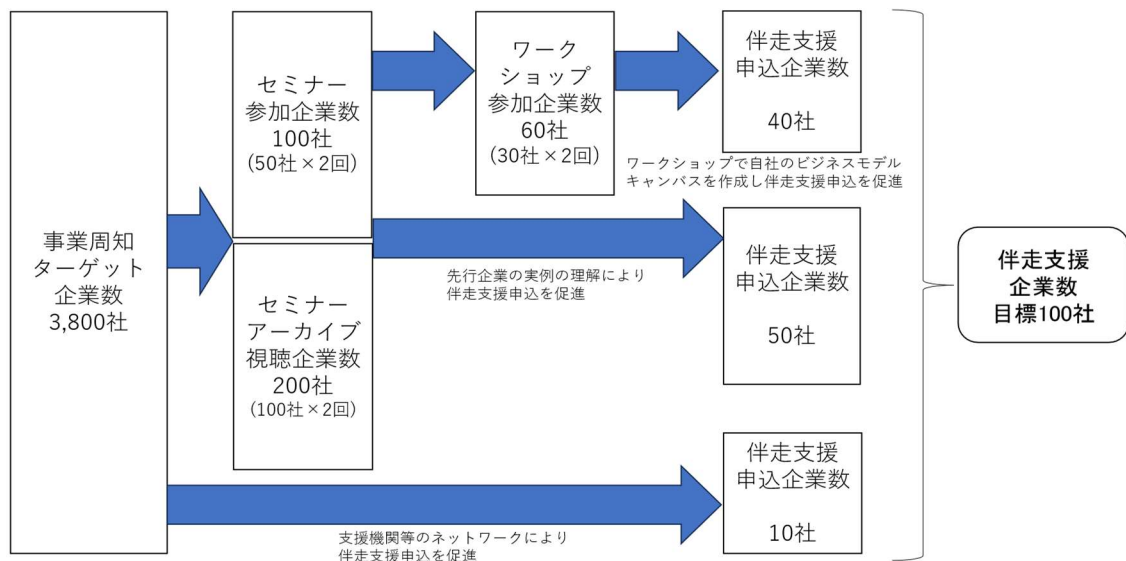

○助成金「交付上限額」

1社当たり 800 千円

予算確保 80,000 千円(=800 千円×100 社)

◆独自提案事項(整理)

○ 伴走支援での生成 AI ツールの活用

専門家による伴走支援を効率的かつ標準的に実施できるよう、ヒアリング内容の整理や提案内容の構造化等を支援する AI ツールを独自開発し運用する。

また、ヒアリングによって作成するビジネスモデルキャンバスを基に、生成 AI を用いた Web サイトのモックアップの提示等を提案する。客観的な現状分析と早期の完成イメージ共有により、限られた事業期間内での確実な計画策定と合意形成を目指す。

○ Web 制作事業者の事前登録の導入

本事業の趣旨に賛同する Web サイト制作事業者を事前登録する「Web マーケティング支援パートナー登録制度(仮称)」を提案する。伴走支援専門家との意図の共有による制作工程の迅速化を図るとともに、適正な助成金執行の担保と導入後の継続的な支援企業フォローの確保を目指す。

○ 助成金事務の円滑化に向けた運用提案

助成金交付の一連の業務については、仕様書に定められた申請受付、審査手続、交付決定通知、実績報告受付、額の確定通知、助成金請求受付および助成金請求交付の流れを基本としつつ、支援企業の導入推進を円滑に進める観点から運用簡素化案を提案する。

具体的には、貴機構で令和 2 年度に実施された「テイクアウト・デリバリー参入促進事業」の助成金申請における制度設計 (<https://www.hiwave.or.jp/news/21668/>) を念頭に、事業着手前の「交付申請書」提出に代え、「事前申出書」と「誓約書」の提出によって着手を可能とする事務フロー構築を提案する。支援企業が審査時期に影響されず迅速に計画を実行できる環境を整え、貴機構および助成金交付事務局の調整負担も軽減する。

2 事業周知・参加者(支援企業)確保

(1) 具体的な周知・確保の施策

① ネットワーク等を活用した周知

当社のネットワーク等を活用し、多くの県内中小企業等に参加を呼びかける。具体的には、県内商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、機械・金属工業関係の組合、中小企業基盤整備機構中国支部、県内金融機関、(公財)広島市産業振興センター、(公財)くれ産業振興センターなどと連携を図り、本事業の周知活動に取り組む。

また、当社も参画する中国地域の企業のデジタル化・DX 支援に関する情報共有・ノウハウ共有を活動内容とする「中国地域 DX 推進ネットワーク」とのコネクションを活用し、緊密な連携を図る。

あわせて、当社の県内各地の構成員がこれまでの関係企業等へ案内、参加呼びかけを行う。

② メディア向けプレスリリース

本事業の取組について、メディアに向けたプレスリリースを実施する。掲載する記事はデザインを含めた効果的な構成とし、記事の構成については事前に貴機構の確認を得る。

③ セミナー等の実施

デジタルコンテンツを活用したマーケティングの理解を深め、本事業を活用する企業発掘・確保につながるよう、以下の取組を実施する。

ア. セミナーの開催

Web マーケティング活用のメリットや活用の理解を深めるとともに、「Web マーケティング環境整備支援事業」への参加動機を促すためのセミナーを開催する。Web サイト制作等の手段の解説にとどまらず、Web マーケティングの効果や手法の理解に注力し、本業務期間終了後も自走できる状態を目指す。

具体的には、成功企業事例として、実際に Web サイトから受注を獲得した製造業の経営者および Web サイト制作事業者の登壇による解説を行う。

「なぜ Web サイトを作っただけでは売れなかったのか」「なぜ営業体制を変革したのか」といった IT 導入以前の苦労や組織変革に焦点を当てたストーリーを提示し、参加者が課題を自分事として捉えられるよう工夫を図る。

セミナーは録画・アーカイブ配信することとする。セミナー開催後も、当日参加できなかった企業への視聴等を継続して呼びかけ伴走支援申込の促進を図る。

時期	会場	開催方法	定員
令和 8 年 5 月末～6 月頃	広島・福山 (各 1 回)	オンライン併用	各会場 50 名

【想定する登壇者候補と会社 Web サイト】

登壇者、事例は、貴機構「チーム型支援」事業における Web マーケティング支援事例等を基に製造業を中心とするが、サービス業等も含めた県内企業の課題や活用可能性が伝わるよう構成を工夫し、業種を問わず参加企業が自社への展開可能性をイメージできる内容とする。

広島会場:株式会社ギケン(廿日市市) 大角様

株式会社呉英製作所(東広島市安芸津町) 代表取締役社長 小谷克宏様

福山会場:ヤマモトロックマシン株式会社(庄原市東城町) 代表取締役社長 山本将登様

鳴滝工業株式会社(尾道市) 代表取締役 河原研介様

※ 上記企業の支援企業:テクノポート株式会社(東京都港区)様

株式会社ギケン様



ヤマモトロックマシン株式会社様





イ. ワークショップの実施

支援の活用に向けた意欲の高い企業を対象とし、デジタルコンテンツを活用して発信すべき「自社の強みの把握」を目的としたワークショップを実施する。

アレンジしたビジネスモデルキャンバスを用いて、社内のキーコンテンツやキーコンテキストの把握・再発見、ターゲットセグメントの設定、顧客の悩みや利得を整理する手法を提供する。

その上で、Web サイトやマーケティングの方向性を検討し、参加者の継続的な取組意欲を喚起して、伴走支援への移行を促進する。

ワークショップについても解説部分は録画・アーカイブ配信を検討し、参加できなかった企業への視聴等を継続して呼びかけ伴走支援申込の促進を図る。

時期	会場	開催方法	定員
令和8年5月末～6月頃 セミナー同時	広島・福山（各1回）	対面開催のみ	各会場30名

【想定する講師】

児玉 学(こだま がく)

当社・理事長、株式会社ファインサポート 代表取締役

資格：IT コーディネータ/インストラクタ、中小企業診断士、知的財産アナリスト

セミナー等講師実績多数、大手経営コンサルタント会社等勤務を経て、1999 年経営コンサルタントとして独立。2000 年(株)ファインサポートを設立、代表取締役就任。経営とITに詳しいコンサルタントとして、今までに1,000 社以上の中小企業の経営支援実績がある。現在、当社・理事長、NPO 法人中四国マネジメントシステム推進機構・理事、一般社団法人中国地域ITC ネットワーク・代表理事を兼務。その他、総務省・テレワークマネージャー、中小機構・中小企業アドバイザー、ひろしま産業振興機構登録専門家、広島市中小企業支援センター窓口相談員などの公職なども歴任。

(2)事業周知ターゲット企業数および目標の算出根拠

事業周知ターゲット企業数 3,800 社

算出根拠：貴機構、商工会議所および商工会の会員数合計×県内製造業比率約9%＝3,800 社

算出に当たっては、貴機構、商工会議所・商工会、関係支援機関および金融機関等のネットワークを通じて接点を持ち得る県内中小企業を母集団として想定した。

特に、当社が支援実績や周知上の強みを有する製造業を主要な訴求対象の一つとして位置付ける一方で、本事業の対象は製造業に限定されるものではないことから、Web コンテンツを活用した販路拡大に意欲を有する県内企業全般を対象として周知活動を行う。

3 伴走支援


(1) 伴走支援のプロセス

専門家による伴走支援の具体的内容として、導入支援を見据え、以下のとおり実施する。

なお、伴走支援を効率的かつ標準的に実施できるよう、ヒアリング内容の整理、確認事項の可視化、提案内容の構造化等を支援する AI ツールを独自開発する。

また、方向性検討などの段階においては、AI を活用し Web サイトのモックアップ生成を行い支援企業と専門家との間で、Web マーケティング計画および Web サイトの役割・方向性に関する共通認識を形成しながら支援を進める。

ヒアリングからWebサイト作成までの流れ

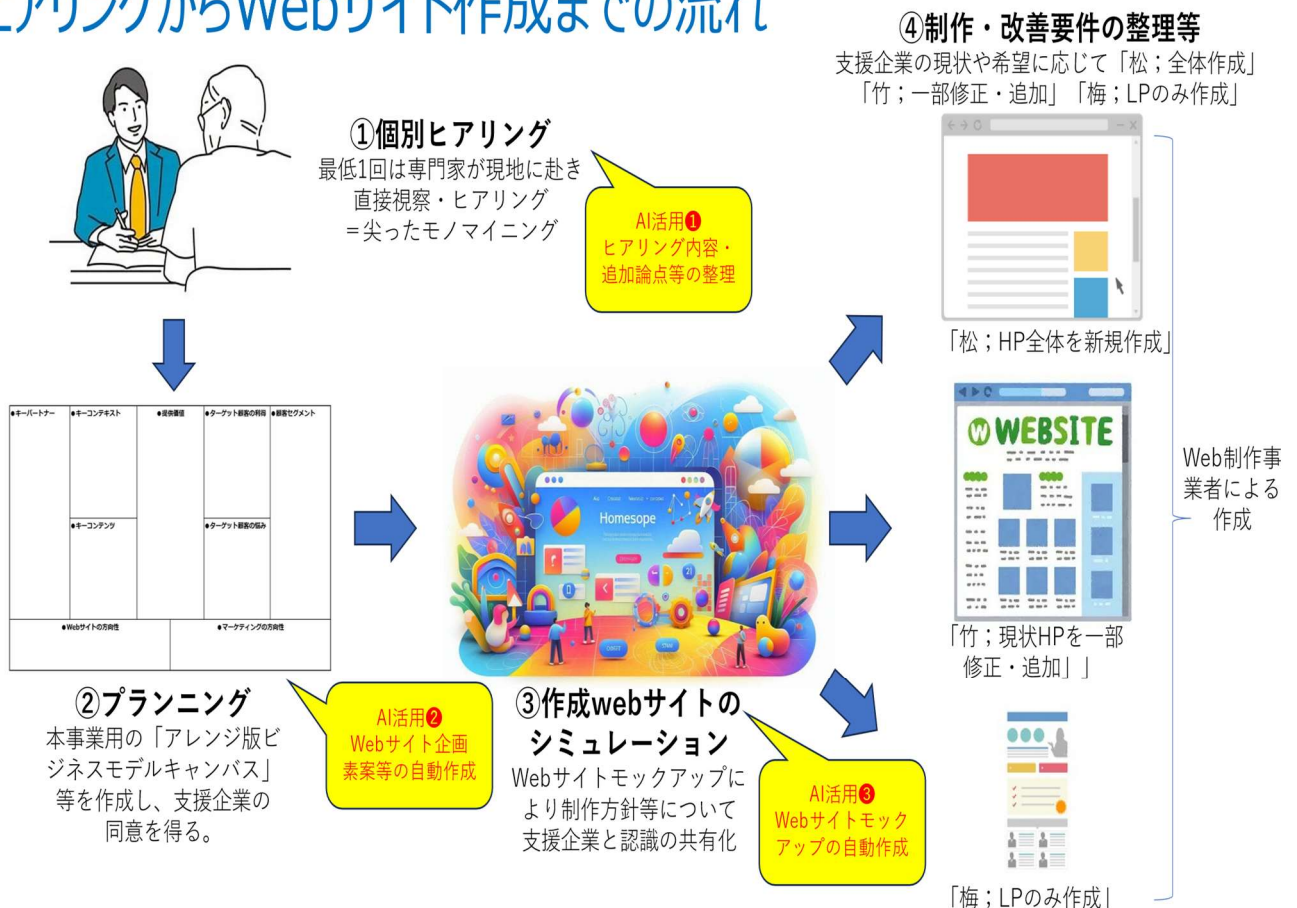


① 個別ヒアリング

伴走支援専門家が最低 1 回は支援企業の現地へ赴き、ヒアリングを実施する。その際、本業務用にアレンジした「ビジネスモデルキャンバス」を対話のシナリオとして機能させるとともに、事業内容、主要顧客、受注構造、営業上の課題、Web サイト活用の現状、更新体制、予算規模感などの支援の前提となる情報を把握する。

現場の状況や製品・サービスを直接確認し、他社にはない独自の強みを発掘する「尖ったモノマイニング」の手法等を用い、事業の現状と潜在的な強み（客観的な情報）の抽出を行う。抽出した情報を踏まえ、「アンゾフ市場マトリクス」を用いたターゲットセグメントの検討等を行う。

この段階では、AI ツールを用いてリアルタイムでヒアリング内容を整理し、確認済み事項、未確認事項、追加で深掘すべき論点を可視化することで、ヒアリングの漏れや確認不足を防ぎ、支援の質の平準化を図る。


【アレンジ版ビジネスモデルキャンバス】

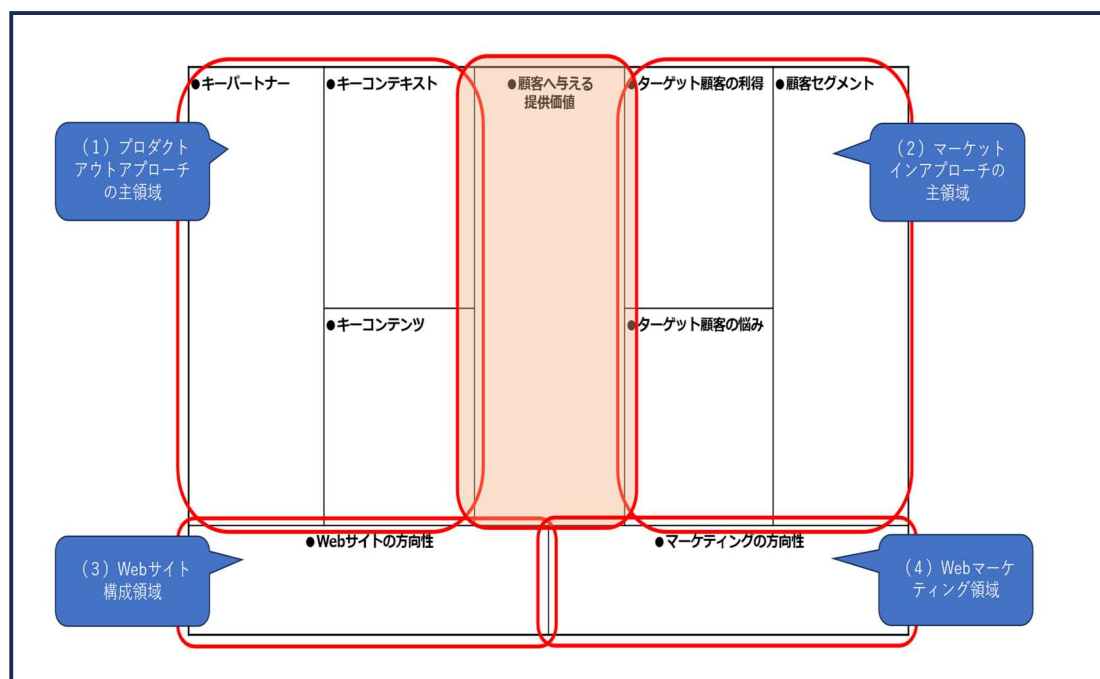


【「尖ったモノマイニング」概念イメージ】

Webサイト構成領域「尖ったモノマイニング」

「尖ったモノ」とは、他と比べて非常に際立った特徴のあるモノ。製品・商品・サービスの場合、一義的には「製品・商品・サービスそのもの」がオンリーワンであることであるが、実は「こだわり」というキーワードで考えると、もっと幅広く捉えることが出来る。別の表現を使えば、「コンテンツ」と「コンテキスト」のどちらか、或いは両方が揃うことが「尖った製品・商品・サービス」の条件だと言える。



【アンゾフの市場マトリクス概念イメージ】

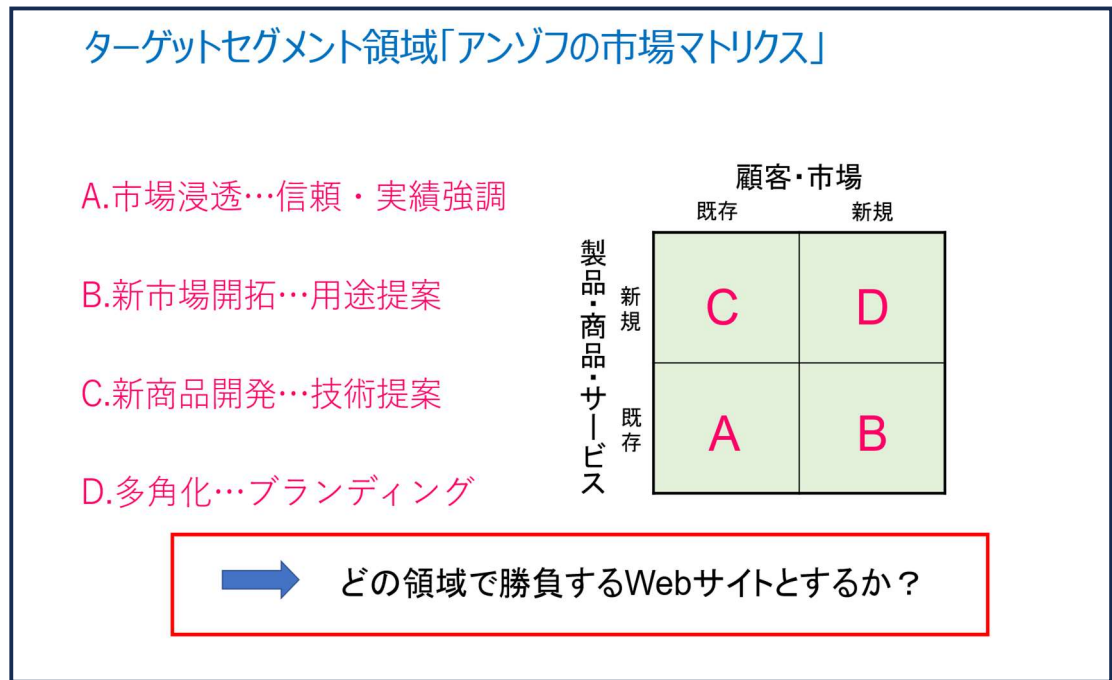

【独自開発 AI ツール画面イメージ】

画面中央部で論点を整理し、未確認項目を画面右部で提示することで聞き漏れや確認不足を防ぐ。

Workspace

キーパートナー

ここにライブで内容が入ってくるで

キーコンテックス

売上は毎年約2000万円。家族経営で運営している。生産はシステム無しで手作業で行っている。原材料は木材・ヤスリ等を使っている。防塵マスクなどの消耗品費や電気代が経費として大きい。短納期で仕上った品質を重視している。

提供価値

超短納期で軸を納品できる
(100~200ロットであれば最短で半日対応)。

ターゲット顧客の利得

ここにライブで内容が入ってくるで

顧客セグメント

顧客は熊野筆を組み立てて販売を取りまとめる会社(B2B)。

キーコンテンツ

熊野筆の軸（ハンドル）を製造。弊社は軸の部分のみを製造している。

ターゲット顧客の悩み

ここにライブで内容が入ってくるで

Webサイトの方向性

ヒアリングに応じて入力されます。

マーケティングの方向性

ヒアリングに応じて入力されます。

Hearing Checklist

全カテゴリ 事業理解

Webマーク現状 **Webマーク企画**

☐ 検討導線 / ジャーニー

• 訴求・メッセージ 0/3

☐ コアとなる強み

☐ 事業理解の前提

☐ 差別化の相手

• 施策方針 0/3

☐ 優先チャネル案

☐ Webで担わせる役割

☐ 解くべき課題

• 制作方針 0/3

☐ トーン&マナーの要件

☐ 参考にしたい見せ方

☐ 想定する導線設計

• 運用計画 0/3

☐ 実行体制

☐ 合意済み方針

② プランニング(課題整理・方向性検討)

ヒアリングで把握した内容をもとに、支援企業の現状課題、販路拡大に向けたボトルネック、Web サイト活用上の弱点など今後整備すべき施策の方向性を整理する。

AI ツールによりヒアリング内容を構造化し、事業や課題の理解・整理を進めるとともに、適宜「Web マーケティング計画」、「Web サイト企画」の素案を自動作成し、専門家が必要な修正等を行う。専門家の経験のみに依らない支援方針整理を可能とする。

あわせて、ヒアリングで収集した情報を「ビジネスモデルキャンバス」へ整理・統合する。

これらを用いて解決すべき事項の優先順位を付けた上で、支援企業と解決方策の合意形成を図る。

【独自開発 AI ツール画面イメージ】

画面右部に事業の強みや課題の整理を提示し、画面左部にその根拠となるヒアリング内容を提示

事業内容整理 根拠説明	事業内容整理 Editor
事業概要と現状 会話で確認されたこと - 熊野筆の軸を作っている会社 - 売上は毎年2000万円程度 - 家族経営で運営 - 手作業での納品が可能 この SECTION への反映 これらの事実が当社の事業概要や現状に関する記述に反映されたため、本文に整理しました。 要約 会話では当社の事業が熊野筆の軸を製造していること、売上や運営形態について確認しました。	事業概要と現状 この section を再生成 当社は熊野筆の軸を製造している会社です。売上は毎年2000万円程度で、家族経営で運営しています。主な顧客は熊野筆を組み立てて販売する会社であり、当社は軸の部分の製造するのみです。納期は短く、特に100ロットから200ロットの場合、半日で納品可能です。原料としては木材やヤスリなどを使用し、加工には手作業が用いられています。
会話で確認できた顧客像 会話で確認されたこと - 木製部品や木工加工品を求めるメーカー - 全国の新しい取引先を求めている - 長く大きく取引できるお客様を1社探している この SECTION への反映 これらの顧客像に関する内容が会話で明確に確認できたため、本文に明記しました。	会話で確認できた顧客像 この section を再生成 顧客は木製部品や木工加工品を求めるメーカーです。特に、長く大きく取引できるお客様を1社でも見つけることが望まれています。全国の新しい取引先を求めています、近隣地域にこだわる必要はありません。
	会話で確認できた強み この section を再生成 当社の強みは超短納期で納品できる点です。特に100ロットから200ロットであれば、半日程度で対応可能です。
	会話で確認できた営業・受注上の課題 この section を再生成 新規顧客獲得において、同等の大手取引先を1社見つけることが課題です。小ロットの注文よりも、長期的な取引ができる顧客を

③ 作成 Web サイトのシミュレーション(最適なコンテンツの提案と認識の共有化)

最適なデジタルコンテンツ、Web サイトを選択するため、完成イメージを早期に共有するためのシミュレーションを実施する。具体的には、②で作成した「Web サイト企画」の情報をプロンプト（指示書）等として、生成 AI ツール（Bolt.new 等を想定）を活用し、支援企業に適合する Web サイトのモックアップ（構成、導線、キャッチコピー等の試案）を自動生成し提示する。デザインを確定することを目的とするのではなく、「誰に何を伝えるべきか」「どのような情報を優先的に掲載すべきか」「どのような導線設計が必要か」といったことを具体的に確認するために用いる。

IT リテラシーに不安等のある支援企業であっても、Web サイト企画やビジネスモデルキャンバスで整理した今後の取組みの方向性が、実際の画面としてどう反映されるかを直感的に理解できる状態をつくる。これは支援企業と専門家との間で Web マーケティング計画および制作方針に関する適切かつ円滑な共通認識の形成にも役立つことが期待できる。

実物（画面）を前にして、Web サイトの役割や訴求の方向性を視覚的に確認することで、支援企業ごとの実情に合わせた最適なデジタルコンテンツを迅速に絞り込み、次工程である手戻りのない的確な発注要件の定義（仕様書作成）へとつなげる。

【Web サイトモックアップ画面イメージ】

画面等を通じて訴求内容や導線設計の認識共有を行う。

全10セクション構成

- ・ ヘッダー（固定ナビ・スマホメニュー・CTAボタン）
- ・ ヒーロー（キャッチコピー・強み一覧・実績数値/バッジ）
- ・ 対応製品（タンク・ホッパー・架台・配管まわり・改造など6種）
- ・ よくある相談（図面未確定・急ぎ対応・1品製作など5パターン）
- ・ 選ばれる理由（6項目）
- ・ 製作事例（カテゴリ絞り込み付き・6事例）
- ・ 加工・設備体制（対応可能範囲・社内工程）
- ・ 相談から納品までの流れ（6ステップ・初回準備物ガイド付き）
- ・ よくある質問（アコーディオン形式・8問）
- ・ 会社情報・対応エリア
- ・ 問い合わせフォーム（カテゴリ・納期・相談内容の項目付き）
- ・ フッター

デザイン方針

- ・ 深いネイビー X スチールブルー X ホワイトの清潔感あるBtoB配色
- ・ CTAはアンバーオレンジで視認性を確保
- ・ スマホ完全対応レスポンス

How can Bolt help you today? (or /command)

山田工業株式会社
ステンレス製品製作・改造

対応製品 よくある相談 製作事例 設備体制 会社情報 ☎ 084-000-0000 製作・改造の相談をする

実績でお伝えする対応力

食品工場向けの製作・改造事例を紹介しています。課題、対応内容、ポイントをセットで確認できます。

すべて タンク ホッパー 架台・フレーム 配管まわり 改造・修繕

タンク

食品原料用ステンレス攪拌タンク製作
食品製造業（広島県内）

課題
ライン増設に伴い、既設設備のレイアウトに合わせた攪拌タンクが必要。市販品では寸法が合わず別注対応が必要だった。

対応内容
現場確認の上、設置スペース・接続配管の位置を採寸。仕様を決定し、攪拌機取付座・マンホール・排弁まで一体で製作。

衛生設計（鏡板形状・溶接仕上げ）に配慮した製作。据付後の配管接続まで確認。

ホッパー

粉体原料投入用ホッパー製作・交換
食品製造業（岡山県内）

課題
老朽化したホッパーの交換。衛生基準の見直しにより、清掃しやすい形状への変更を検討していた。

対応内容
既設ホッパーを確認し、フランジ寸法・投入口形状を踏まえた新規設計。清掃口を追加し、内面仕上げを改善して製作。

停止時間を最小化するため、取付寸法を合わせた差替え対応。

架台・フレーム

機器据付用ステンレス架台製作
食品製造業（広島県福山市）

課題
新規導入機器の設置に際し、既設床面の凹凸と配管位置を考慮した架台が必要だった。

対応内容
現場確認で床面状況・アンカー可能位置・機器寸法を把握。高さ調整機構付きのSUS304架台を製作・設置。

レベル調整ボルト付きで、据付後の微調整にも対応。

※ 伴走支援における生成 AI ツール活用の基本方針

本業務の伴走支援において生成 AI 等のツールを活用するに当たっては、伴走支援専門家が責任をもって以下の管理を実施する。

- ・ 支援企業からヒアリングした経営情報等を AI ツールで処理する際は、入力データが外部の AI 学習に利用されない（オプトアウトされた）環境を利用する等、機密情報の漏洩防止を徹底する。
- ・ AI が生成したビジネスモデルキャンバスや Web サイトモックアップ等は、あくまで効率化および初期イメージ共有のための補助的手段として位置づける。内容の適切性等については、担当する伴走支援専門家が確認することとする。

④ 制作・改善要件の整理等と支援内容の類型化および助成金申請支援【伴走支援専門家による導入支援】

作成 Web サイトのシミュレーションや支援企業と専門家との間の認識の共有を踏まえ、Web サイト制作または回収に必要な目的、想定ターゲット、訴求内容、ページ構成、必要素材、導線設計、公開後に確認すべき指標等を整理する。

この段階では、AI ツールを用いて、Web サイトに求める要件情報を整理し、制作事業者に引継ぎやすい形にまとめる。

公開後の効果検証を見据え、問い合わせ件数、問い合わせ完了率、CTA クリック率、流入経路、主要ページ閲覧状況等のモニタリングしようについても合わせて整理・定義し、支援企業と専門家間で「何を成果指標として継続確認するか」を明確にする。

なお、制作・改修等を行う Web サイトの現状・規模・機能等により支援パターンを類型化し、その後の手続きを円滑に進める。

続いて、支援企業が助成金交付申請を希望する場合は、支援企業の主体性を尊重しつつ、論理構成や表現の助言等を行い、助成金交付申請に向けて事務局への計画書等の提出支援を実施する。

【類型化のイメージ】

類型	イメージ	備考
松パターン	全面リニューアル	
竹パターン	一部改修・追加	
梅パターン	LP 作成のみ	
計測・分析機能の充実等	未導入・活用不十分の改善	既存サイトへの機能追加等も想定される。

⑤ 導入後の確認・活用支援（自立化支援）【伴走支援専門家による導入支援】

支援企業におけるコンテンツ導入をゴールとせず、導入後（ただし本業務期間内）の運用確認や操作支援、モニタリングの実施など支援企業の状況に応じて適切なフォローを行い、自立して Web マーケティングを推進できるよう支援する。

具体的には、④で整理・定義したモニタリング指標をもとに、Web サイト公開後の流入経路、主要ページ閲覧状況、CTA クリック率、問い合わせ件数、問い合わせ完了率等を継続的に確認し、当初想定したターゲット設定、訴求内容、導線設計が適切に機能しているかの検証と必要に応じた見直しの提案等を行い、継続的な改善につながる支援を実施する。

(2) 伴走支援企業数の目標および算出根拠(目論見)

伴走支援企業数の目標 100 社

○セミナー・ワークショップ（以下「WS」）参加等から伴走支援申込 90 社程度

・周知 3,800 社 →セミナー参加 100 社(周知の約 3%) →WS 参加 60 社(セミナー参加 100 社の 60%)

→伴走支援申込 40 社 (WS 参加の約 70%)

セミナー聴講により「単なるツール導入ではなく、自社の強みの再定義が急務である」と課題認識を改めた層に対し、同日開催の WS において、ビジネスモデルキャンバスを用いた実践的な整理手法を訴求し伴走支援申込を促進。

・周知 3,800 社 →セミナーアーカイブ視聴企業 200 社およびセミナーのみ参加(WS 参加なし)40 社(周知の約 3.5%) →伴走支援申込 50 社 (セミナーアーカイブ視聴・セミナーのみ参加の約 20%)

既存の Web サイトや営業体制に限界を感じている層に対し、製造業の先行する具体的な成功事例を訴求し、現状打破のヒント等を得るための伴走支援申込を促進。

○支援機関等の紹介から伴走支援申込 10 社程度

連携する支援機関等で既に経営課題の整理が進んでおり、早急な Web マーケティングの実行と助成金活用を必要とする層に対し、支援機関等の担当者の推薦等により伴走支援申込を促進。

4 導入支援(助成金交付事務)

(1)助成金の制度設計(提案)

① 助成対象者

本事業のセミナー、ワークショップに参加し、伴走支援を受けている支援企業
(伴走支援を受けていることは必須とする。)

② 助成対象期間

事前申出完了通知日(後述)から令和9年1月31日まで(予定)

③ 助成率・助成金上限額

助成対象経費の3分の2以内、助成金上限額:80万円、千円未満切り捨て

④ 助成対象経費

本事業目的の達成および適切な計画策定を担保するため次のとおり条件を設ける。

・「オ. 広告宣伝費」のみとならないこと

・「エ. データ計測構築費」を対象経費としない場合も、原則として、データ計測・分析等の取組は行うこと

区分	内容	備考
ア. 市場調査費	ターゲット選定、競合比較、キーワード調査等、Webサイトの企画立案に直接必要な調査 ※ 外部委託に限る。	
イ. Web サイト構築費	Webサイトの設計(UI/UX)、デザイン、コーディング、システム(CMS)の実装、SEO内部対策および既存サイトの改修に要する経費。ECサイトの参画初期登録費	
ウ. コンテンツ制作費	サイト掲載用の写真・動画制作、図表作成、原稿作成およびECサイト用の商品データ制作等に要する経費	
エ. データ計測構築費	サイトの利用状況(アクセス元、閲覧状況等)や目標達成(コンバージョン)を客観的に把握するための分析ツール導入および初期設定に要する経費	
オ. 広告宣伝費	リスティング広告、SNS広告の出稿および広告運用代行、広告制作に要する経費	・3か月以内(等の期間の上限設定) ・データ計測・分析等の取組と整合的に行うこと
カ. 自走化・内製化支援費	導入後の継続運用のための社内運用マニュアル作成、操作説明およびWebマーケティングに関する実務研修に要する経費	
キ. その他	上記に掲げるもののほか、本事業の目的達成のために事業実施者(貴機構)が特に必要と認めた経費	

※ 助成対象外の経費

対象外となる経費の例

・経常的な運営費用(ランニングコスト)

サーバー利用料、ドメイン維持管理料、Web サイトの月額保守費用、
助成対象期間外の広告運用・出稿費用

・EC 関連の運用・変動費用

各種販売手数料、決済手数料、在庫管理・物流費用、
EC モール等の月額出店料（初期登録費以外の維持費）

・汎用性の高い機器・設備の購入費用

PC、タブレット、スマートフォン、デジタルカメラおよび周辺機器、事務用ソフトウェア、消耗品

・支援企業自身の内部コスト

自社スタッフの人件費、旅費、通信費

・その他

振込手数料、公租公課（消費税等）および本事業に直接関係のない販促費用

以上のほか、経費の該当・非該当について、事務局において疑義等が生じる場合は、支援企業等に対し確認を行い、本事業目的の達成に適合的でない事業実施者(貴機構)が判断する場合は、対象外とすることが出来るものとする。

⑤ 実績報告および成果の確認(証憑書類の提出)

Web マーケティング計画実行完了後、助成金交付に当たっては、以下の書類提出を求める。

・Web マーケティング実施報告書

実行したマーケティング計画の概要、公開した Web サイトの URL 等

・計測設定報告書

Web マーケティング計画において設定した各指標（コンバージョン、読了率等）が正しく計測されていることが確認できる管理画面のキャプチャ資料

・市場調査報告書(市場調査費を計上した場合)

調査手法、分析結果およびそれに基づいた Web マーケティング計画への反映内容をまとめた資料
(外部専門機関の発行するもの)

・広告運用実績レポート(広告宣伝費を計上した場合)

出稿媒体、期間、費用、インプレッション、クリック数等が明記された媒体社または代理店発行のレポート

・支出証拠書類

見積書、発注書、納品書、請求書、および支払いを証明する振込受領証等の写し


⑥ 「採択基準の考え方」

単なる Web サイト制作ではなく、売上や問い合わせ等の成果につながる Web マーケティングの実装が目的であることから、ターゲット顧客、支援企業の強み、ウェブサイト上で促す顧客行動（問い合わせ・資料請求等）が整理されている計画であることを必須とする。また、制作後の効果検証と改善を可能とするため、原則として、流入経路、主要ページ閲覧状況の検証などアクセス解析や問い合わせ件数、問い合わせ完了率の計測等のデータ計測・分析等の取組を行う計画であることを求める。これらの要件に基づき、審査項目として①事業目的との整合性、②計画内容の具体性、③実現可能性、④費用対効果、⑤導入後の継続運用可能性、⑥見積内容および助成対象経費としての妥当性等の観点から総合的に確認し、採択候補とする。あわせて、事務局内での複数者確認および必要に応じた専門家確認を行うことで、適正な事務処理を担保する。

(2) 助成金交付事務局の運営

① 助成金交付手続の流れ

(ただし、②の貴機構との協議・合意前提の助成金事務の円滑化に向けた運用提案に沿ったもの)

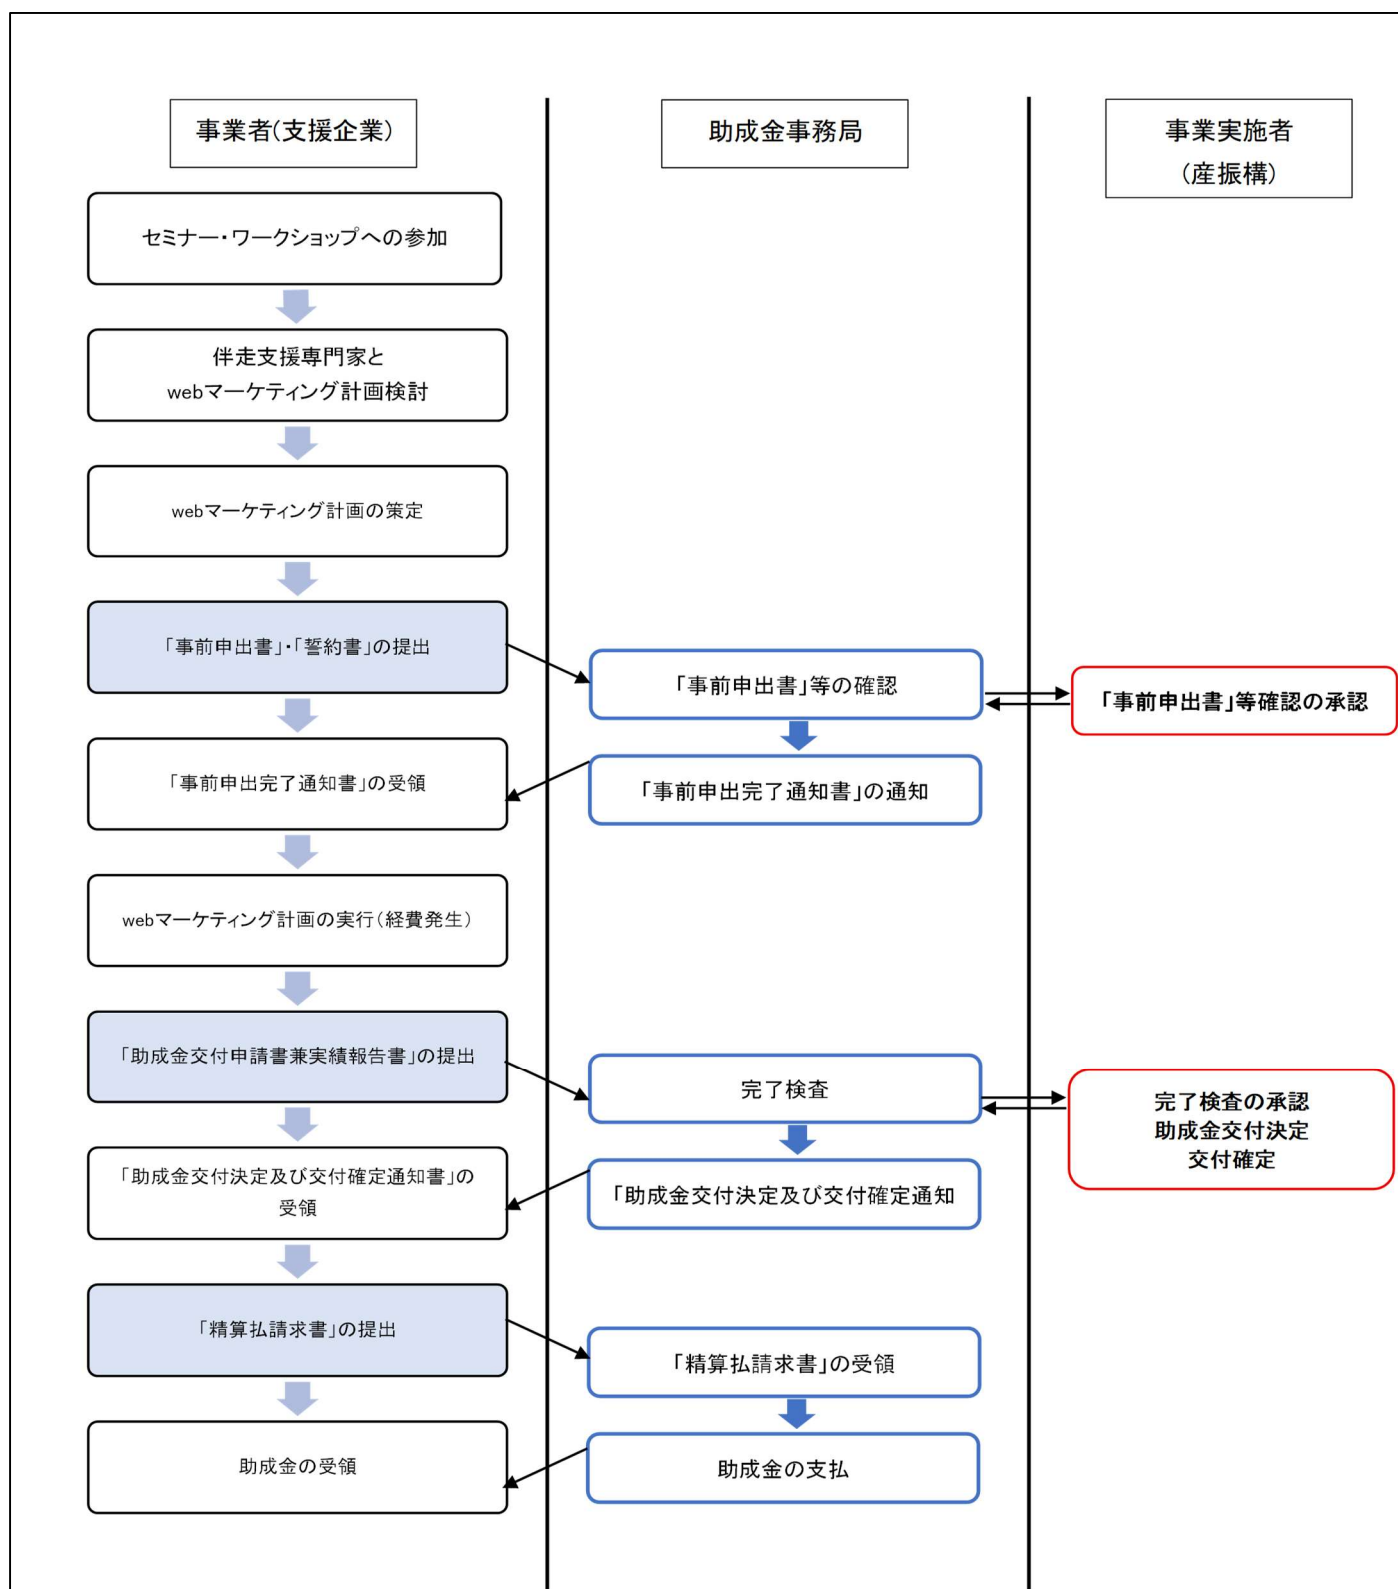

② 助成金事務の円滑化に向けた運用提案(貴機構との協議・合意前提)

助成金交付の一連の業務については、仕様書に定められた申請受付、審査手続、交付決定通知、実績報告受付、額の確定通知、助成金請求受付および助成金請求交付の流れを基本としつつ、支援企業の導入推進を円滑に進める観点から運用簡素化案を提案する。

貴機構との協議と合意が前提ではあるが、具体的には、貴機構で令和2年度に実施された「テイクアウト・デリバリー参入促進事業」の助成金申請における制度設計 (<https://www.hiwave.or.jp/news/21668/>) を念頭に、一般的に「事業着手前の段階」で必要となる「交付申請書」提出に代え、以下に概要を示す「事前申出書(仮称)」と「誓約書」の提出を求め、Web マーケティング計画実行後に「交付申請書(仮称)」と「実績報告書」の提出を求めるといった設計を想定している。

この仕組みにより、支援企業は、助成金交付を決定する審査(会)の実施時期(頻度)から比較的自由に Web マーケティング計画実行に着手することが可能となる。

また、事務局においては、審査(会)運営に係る調整等の負担を軽減することが期待できるとともに、助成金交付までの事務の円滑な推進に役立つと考えられる。

「事前申出書(仮称)」

助成対象者の要件を満たす旨、助成対象経費の内容・数量・金額・支払予定日等を含む Web マーケティング計画を明記し、助成金制度活用を申し出る文書

「誓約書」

事前申出書に記した内容に相違ないことを誓約するもの。あわせて、仮に、事前申出書に記した内容に反する事実が判明し、助成金交付決定が取り消された場合には、交付された助成金の全部または一部を返還することを予め誓約する文書

③ 事務局運営体制等

ア 情報共有と進捗管理の基盤整備

オンラインストレージ(Box 等想定)上で案件のデータを管理し、伴走支援専門家、事務局担当者、貴機構他が、随時、現状を把握できる仕組みを設ける。

イ 相談窓口の設置と効率的な制度周知

事務局内に相談窓口担当者を設定し、支援企業等からの問い合わせに対して迅速かつ的確な対応を行う。

本事業の制度説明については、初期に開催するセミナーおよびワークショップに合わせて実施することで、手続きに関する情報を効率的かつ確実に周知する。

ウ 伴走支援専門家と事務局の連携による推進体制

助成金申請等に向けて、各支援企業を担当する伴走支援専門家と事務局担当者が緊密な連携を図り、支援企業における Web マーケティング計画の確実な推進に取り組む。

エ Web マーケティング専門家による事前申出のチェック機能

支援企業から提出される「事前申出申請書」については、Web マーケティング専門家が確認統括を担当する。当該専門家の統括のもと、計画内容や見積りの適切性を客観的に確認したうえで、事務局から事前申出完了通知を行う。

④ Web マーケティング支援パートナー登録制度(仮称)の設定(貴機構との協議・合意前提)

貴機構との協議と合意が前提ではあるが、助成金により実施する Web サイト制作等の委託先候補として、Web サイト制作事業者を事前登録することを提案する。

登録基準としては、支援企業の Web マーケティング計画実行の支援への協力が期待できる本事業の趣旨に賛同する事業者などとし、誓約書の提出を求めるなどの対応を想定する。


事業者を登録することで、制作までの工程を迅速化し、短期間での確実な実装を目指す。また、助成金の適正な執行を担保して不正を防止するとともに、導入後の継続的な支援企業フォローの確保を目指す。

5 スケジュール

区分	R 8 年										R 9 年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		
事業周知・ 参加者確保			セミナー ワークショップ										
伴走支援			ヒアリング→プランニング→シミュレーション ※随時										
導入支援 (伴走支援専門家)				助成金申請支援 → 導入後活用支援									
導入支援 (助成金事務局)		制度周知等											
			計画受付・審査・確定・支払 ※随時										

6 実施体制

各関係者と調整をとりながら進行する体制とする。体制図は下図のとおりである。

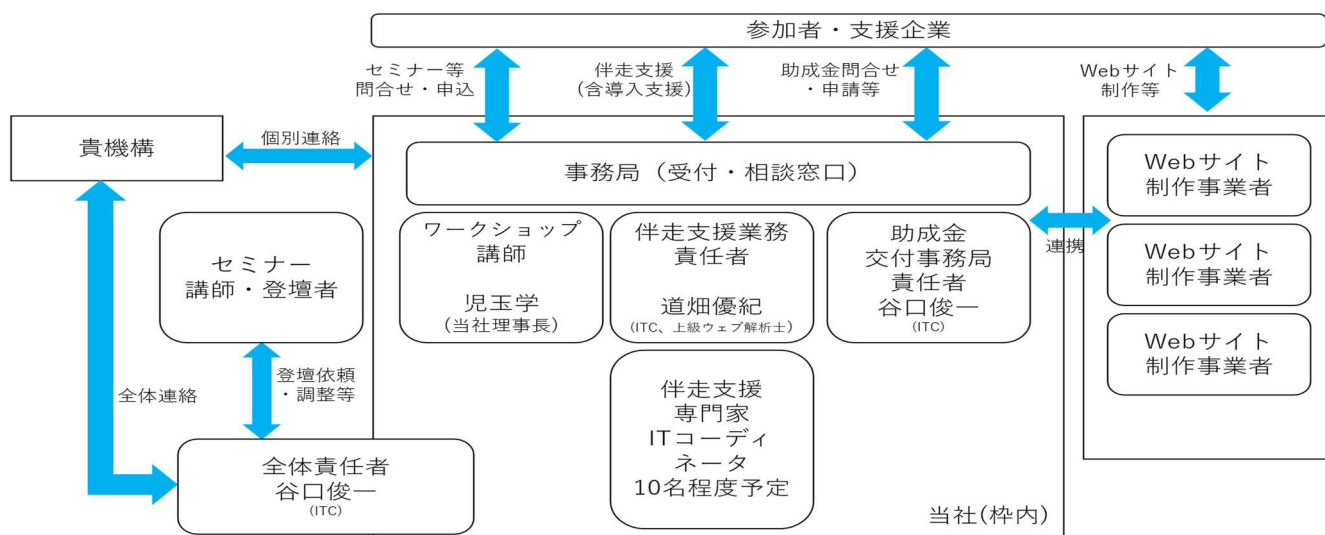

業務統括責任者（全体責任者） 谷口俊一

当社所属、IT コーディネータ、行政書士 自治体で 20 年勤務し主に産業政策・経営支援に関する業務に従事。当社構成員として、当社が受託する DX 推進支援等に関する商工会連合会、広島市、広島県それぞれの事業への参画実績（広島県事業では一部門の運営管理を担当）を有する。

7 類似業務実績等

■令和7年度

①業務名： 広島県DX事例共有会運営等業務（セミナー等業務類似）

業務概要： 民間事業者がDX推進の方法や課題の克服方法、デジタル技術の効果等を理解し、具体的な取組に踏み出すことを目的とした事例共有会を開催し、様々な講演や体験を通じて知識を共有する業務

発注者： 広島県

②業務名： IT 導入アドバイザー派遣実施業務（伴走支援業務類似）

業務概要： 広島広域都市圏内の自動車関連企業およびものづくり企業に、IT に関するアドバイザーを派遣し、企業の業務フローの整理や、問題点の洗い出し、課題解決に役立つ IT の導入に取り組むことで、デジタル化を支援することを目的とする業務

発注者： 広島市

③業務名： 広島県宿泊税システム整備費補助金関係業務（助成金業務類似）

業務概要： 宿泊税導入に伴って発生する既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築並びにハードウェアおよびソフトウェアの購入に係る経費補助に関する審査助言業務

発注者： 広島県

■令和6年度

①業務名： 広島県DX支援環境構築業務（セミナー等、伴走支援、支援環境構築業務類似）

業務概要： 支援機関（商工会議所や商工会、金融機関など）向けのデジタルリテラシー・支援スキル向上研修、支援機関とITベンダー等が連携した民間事業者等のDX実践を支援する環境の構築（事例研究会、支援機関向け研修、デジタルツール研修、DX推進支援環境、支援者育成プログラム）

発注者： 広島県

②業務名： IT 導入アドバイザー派遣実施業務（伴走支援業務類似）

業務概要： 令和7年度と同様

発注者： 広島市

■令和5年度

①業務名： 小規模事業者等DX推進支援事業（セミナー等および伴走支援業務類似）

業務概要： 商工団体向けDX相談窓口業務、商工会議所DX推進支援業務、所内DX研修等

発注者： 広島県

②業務名： 観光地ひろしまDX推進事業実施に係るアドバイザリー業務（助成金業務類似）

業務概要： 観光産業の生産性向上のためのデジタル技術活用やDXに向けた基盤整備に取り組むサービス・機器の導入に係る経費補助の審査助言業務

発注者： (一社)広島県観光連盟

■その他の類似業務実績

○業務名： 中小企業デジタル化推進事業 データ活用事業（令和3年度）（Webマーケティング類似）

業務概要： 既存データ活用セミナー、同フォローアップ

発注者： 広島県

8 本業務実施に当たっての優位性

当社は、広島県内における DX 支援環境構築や IT 導入アドバイザー派遣など、セミナー、ワークショップの実施や、企業に赴いて行う伴走支援コンサルティングなどを業務内容とする公的支援事業の豊富な企画運営実績を有している。また、構成員として 40 名程度を擁しているが、その過半数が企業内の専門家ではなく、独立した専門家であり、県内各地に拠点を有している。

当社では、これまでの公的支援事業を担ってきた人材が、本業務における支援企業への伴走支援専門家を担うことが可能である。さらに、県内各地に構成員が拠点を有していることから、地域の実情の理解に基づく支援や、支援企業に直ちに赴くことが可能であるなど、きめ細やかな対応が可能である。

さらに、(一社)ウェブ解析士協会との連携が可能な Web マーケティング専門家が構成員として所属しており、その知見・ノウハウを活用できることも大きな優位性である。

加えて、当社も参画する中国地域の企業のデジタル化・DX 支援に関する情報共有・ノウハウ共有を活動内容とする「中国地域 DX 推進ネットワーク（事務局：(一社)中国経済連合会、中国経済産業局、中国財務局）」や、これまでの事業受託実績等から緊密な関係性のある広島商工会議所、広島県商工会連合会のほか、中国経済産業局、(独)中小企業基盤整備機構中国本部など、国や支援機関のネットワークを活用できることも大きな強みである。

これらにより製造業等の現場に即した課題抽出から地域の Web 制作事業者と連携した自走化支援まで、一貫して実行できる実務体制を備えている点が優位性である。
